



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUE.



Huehuetlán El Grande, Puebla; a 14 de julio de 2023.

OFICIO No. MHG-DOP-147/2023

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores correspondientes al Informe Definitivo 2022**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Segundo Informe Trimestral del Ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.


Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

HUEHUETLÁN
EL GRANDE, PUE.


C. JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ CARPIO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUEHUETLÁN
EL GRANDE, PUEBLA.



Archivo. Control de Gestión.



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INFORME DEFINITIVO 2022



FISM-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE220302127957	200103	22002	REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO A LAS INSPECTORIAS Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA).	SANTA MARTHA YANCUITLALPAN, SAN JUAN COATELCO, SAN MARTIN ATEMPAN	\$ 916,550.90	\$ 914,676.30	\$ 914,676.30	\$ 914,676.30	\$ 914,676.30	\$ 914,676.30	\$ 914,676.30	100.00%	100.00%	M3	3024.00	OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE.
PUE220202083928	100854	22003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A SAN NICOLÁS ENTRE BARRANQUILLA Y CALLE 21 DE MARZO, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN AHUEHUETLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SAN AGUSTÍN AHUEHUETLA	\$ 1,001,032.63	\$ 998,770.87	\$ 998,770.87	\$ 998,770.87	\$ 998,770.87	\$ 998,770.87	\$ 998,770.87	100.00%	100.00%	M2	701.22	OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE.
PUE220202084144	101735	22004	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL DESTINO ENTRE CALLE TOXPAN Y CALLE TECORIZO, DEL BARRIO DE ANALCO PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 1,330,585.44	\$ 1,528,941.35	\$ 1,528,941.35	\$ 1,528,941.35	\$ 1,528,941.35	\$ 1,528,941.35	\$ 1,528,941.35	100.00%	100.00%	M2	1279.92	OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE.
PUE220202084192	101872	22006	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DEL CALLEJÓN CORREGIDORA, ENTRE CALLE EL VALOR Y CALLE DEL PROGRESO DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 356,768.73	\$ 356,068.43	\$ 356,068.43	\$ 356,068.43	\$ 356,068.43	\$ 356,068.43	\$ 356,068.43	100.00%	100.00%	M2	467.82	OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE.
PUE220202084177	101823	22007	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DEL LADRILLO ENTRE CALLEJÓN DE LA GALLERA Y CALLE DEL PROGRESO, DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 998,713.87	\$ 997,195.67	\$ 997,195.67	\$ 997,195.67	\$ 997,195.67	\$ 997,195.67	\$ 997,195.67	100.00%	100.00%	M2	945.04	OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE.
PUE220402192031	373619	22008	CONSTRUCCIÓN DE 80 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN AHUEHUETLA, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA).	SAN AGUSTÍN AHUEHUETLA	\$ 1,153,738.93	\$ 1,153,738.93	\$ 1,153,738.93	\$ 1,153,738.93	\$ 1,153,738.93	\$ 1,153,738.93	\$ 1,153,738.93	100.00%	100.00%	SANITARIOS	80.00	OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE.
PUE220302128575	202820	22009	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ATLAPULCO, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SAN MIGUEL ATLAPULCO	\$ 543,775.84	\$ 542,275.84	\$ 542,275.84	\$ 542,275.84	\$ 542,275.84	\$ 542,275.84	\$ 542,275.84	100.00%	100.00%	M2	128.25	OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE.
PUE220302130181	209699	22010	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 423,980.00	\$ 412,000.00	\$ 412,000.00	\$ 412,000.00	\$ 412,000.00	\$ 412,000.00	\$ 412,000.00	100.00%	100.00%	PROYECTO	18.00	SERVICIO AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE.
PUE220402185387	352943	22011	MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS BARRIOS DE IXTLAHUACAN, CENTRO Y COATEPEC, PERTENECIENTES A LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 163,726.60	\$ 162,417.70	\$ 162,417.70	\$ 162,417.70	\$ 162,417.70	\$ 162,417.70	\$ 162,417.70	100.00%	100.00%	M2	264.60	OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE.
PUE220402186238	356082	22013	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 540,086.59	\$ 539,273.07	\$ 539,273.07	\$ 539,273.07	\$ 539,273.07	\$ 539,273.07	\$ 539,273.07	100.00%	100.00%	M	964.71	OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE.

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Gobierno del Estado de Puebla
 Dirección General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 14 JUL 2023
 RECIBIDO
 FIA2/SB/CGPSE



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INFORME DEFINITIVO 2022



PUE220302128603	202930	22014	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA YANCUITLALPAN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTA MARTHA YANCUITLALPAN	\$ 926,224.06	\$ 924,666.43	\$ 924,666.43	\$ 924,666.43	\$ 924,666.43	\$ 924,666.43	\$ 924,666.43	\$ 924,666.43	100.00%	100.00%	M2	1083.09	OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE.
PUE220302128623	203006	22015	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE PUENTE EXISTENTE Y CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COATEPELCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SAN JUAN COATEPELCO	\$ 1,022,689.74	\$ 1,036,171.74	\$ 1,036,171.74	\$ 1,036,171.74	\$ 1,036,171.74	\$ 1,036,171.74	\$ 1,036,171.74	\$ 1,036,171.74	100.00%	100.00%	M2	929.77	OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE.
PUE220302128636	203110	22016	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN DE LA TRIPA ENTRE CALLEJÓN DEL ZORRILLO Y CALLE AVIACIÓN DEL BARRIO DE SAN ANTONIO COATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	BARRIO SAN ANTONIO COATEPEC	\$ 999,757.52	\$ 998,125.33	\$ 998,125.33	\$ 998,125.33	\$ 998,125.33	\$ 998,125.33	\$ 998,125.33	\$ 998,125.33	100.00%	100.00%	M2	874.40	OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE.
PUE220302128647	203144	22017	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CARRETERA A PUEBLA Y BACHILLERATO GENERAL OFICIAL HEROES DEL 5 DE MAYO; DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ATLAPULCO, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SAN MIGUEL ATLAPULCO	\$ 1,442,268.97	\$ 1,440,441.55	\$ 1,440,441.55	\$ 1,440,441.55	\$ 1,440,441.55	\$ 1,440,441.55	\$ 1,440,441.55	\$ 1,440,441.55	100.00%	100.00%	M2	1319.33	OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE.
PUE220302129655	207218	22018	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ATLAPULCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SAN MIGUEL ATLAPULCO	\$ 210,873.69	\$ 210,189.25	\$ 210,189.25	\$ 210,189.25	\$ 210,189.25	\$ 210,189.25	\$ 210,189.25	\$ 210,189.25	100.00%	100.00%	CUARTOS	2.00	OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE.
PUE220402186407	356528	22020	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO PARA LA ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA EN SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. (TERCERA ETAPA).	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 1,016,339.85	\$ 1,001,125.63	\$ 1,001,125.63	\$ 1,001,125.63	\$ 1,001,125.63	\$ 1,001,125.63	\$ 1,001,125.63	\$ 1,001,125.63	100.00%	100.00%	M2	215.33	OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE.
PUE220402188038	361580	22021	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN DE LA GALLERA, ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 556,274.13	\$ 552,268.34	\$ 552,268.34	\$ 552,268.34	\$ 552,268.34	\$ 552,268.34	\$ 552,268.34	\$ 552,268.34	100.00%	100.00%	M	692.60	OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE.
PUE220402188187	362007	22022	REHABILITACIÓN DE CANAL DE RIEGO PARA USO AGRÍCOLA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 522,472.21	\$ 519,045.26	\$ 519,045.26	\$ 519,045.26	\$ 519,045.26	\$ 519,045.26	\$ 519,045.26	\$ 519,045.26	100.00%	100.00%	M	140.73	OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE.
PUE220402188583	363136	22023	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA OTZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTA ANA OTZOLOTEPEC	\$ 999,362.71	\$ 996,861.09	\$ 996,861.09	\$ 996,861.09	\$ 996,861.09	\$ 996,861.09	\$ 996,861.09	\$ 996,861.09	100.00%	100.00%	M	3200.79	OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE.
PUE220402188740	363563	22024	CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COLONIA AGRÍCOLA HIDALGO, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	COLONIA AGRÍCOLA HIDALGO	\$ 864,181.93	\$ 861,897.16	\$ 861,897.16	\$ 861,897.16	\$ 861,897.16	\$ 861,897.16	\$ 861,897.16	\$ 861,897.16	100.00%	100.00%	TANQUE	1.00	OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE.


SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 Gobierno de Puebla
 14 JUL 2023
 RECIBIDO
 F42/SB/CGP/SE



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INFORME DEFINITIVO 2022



PUE220402188886	363962	22025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE LAS FLORES Y CALLE LA ESTACIÓN, DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 388,411.40	\$ 386,031.63	\$ 386,031.63	\$ 386,031.63	\$ 386,031.63	\$ 386,031.63	\$ 386,031.63	\$ 386,031.63	100.00%	100.00%	M	389.74	OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE.
PUE220402192226	374301	22027	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 792,029.64	\$ 788,260.52	\$ 788,260.52	\$ 788,260.52	\$ 788,260.52	\$ 788,260.52	\$ 788,260.52	\$ 788,260.52	100.00%	100.00%	M	3517.80	OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE.
PUE220402190052	367374	22028	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ZAPATA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS HUAJUAPAN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SAN NICOLÁS HUAJUAPAN	\$ 1,058,628.77	\$ 1,057,382.91	\$ 1,057,382.91	\$ 1,057,382.91	\$ 1,057,382.91	\$ 1,057,382.91	\$ 1,057,382.91	\$ 1,057,382.91	100.00%	100.00%	M2	841.20	OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE.
PUE220402202909	NA	22029	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE REAL DE LA COSTA SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO AJALPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SAN PEDRO AJALPAN	\$ 718,758.46	\$ 9,500.00	\$ 9,500.00	\$ 9,500.00	\$ 9,500.00	\$ 9,500.00	\$ 9,500.00	\$ 9,500.00	100.00%	100.00%	M2	511.80	OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE. (LA OBRA SE LLEVO A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS: FONDO FORTAMUN CAPITAL: \$ 705,591.97 INTERESES: \$ 2,325.38 TOTAL: \$ 707,917.35 FONDO FISM INTERESES \$ 9,500.00 EL MONTO TOTAL DE LA OBRA CONTRATADA ES DE \$ 717,417.35)
FORTAMUN-DF																	
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
NA	NA	22001	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 1,207,308.30	\$ 1,221,152.00	\$ 1,221,152.00	\$ 1,221,152.00	\$ 1,221,152.00	\$ 1,221,152.00	\$ 1,221,152.00	100.00%	100.00%	PAGOS	12.00	ACCION AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE.	
PUE220202099167	NA	22005	REHABILITACIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y ALCANTARILLA EN EL CALLEJÓN TONALCO ENTRE CALLE AVENTURA Y CALLE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 121,647.36	\$ 116,112.88	\$ 116,112.88	\$ 116,112.88	\$ 116,112.88	\$ 116,112.88	\$ 116,112.88	100.00%	100.00%	M2	245.81	OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE.	
PUE220202099177	NA	22012	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LÁMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 352,528.71	\$ 350,269.37	\$ 350,269.37	\$ 350,269.37	\$ 350,269.37	\$ 350,269.37	\$ 350,269.37	100.00%	100.00%	PZAS	350.00	OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE.	
PUE220302140260	NA	22019	MANTENIMIENTO DE CALLES Y ACCESOS PRINCIPALES POR RETIRO DE DERRUMBES EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 427,596.18	\$ 423,136.78	\$ 423,136.78	\$ 423,136.78	\$ 423,136.78	\$ 423,136.78	\$ 423,136.78	100.00%	100.00%	M3	3507.50	OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE.	
PUE220402203756	NA	22026	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CALLEJÓN DE LA GALLERA, PARTIENDO DE LA CARRETERA E.C. KM. 5 (LOS ÁNGELES - LA CANTERA) - SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, CON UNA LONGITUD DE 1,643.50, EN LAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN E IXTLAHUACÁN, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, EN EL ESTADO DE PUEBLA. (PRIMERA ETAPA).	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 1,750,000.00	\$ 1,750,000.00	\$ 1,750,000.00	\$ 1,750,000.00	\$ 1,750,000.00	\$ 1,750,000.00	\$ 1,750,000.00	100.00%	100.00%	M	821.75	OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE. PRIMERA ETAPA, EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO.	

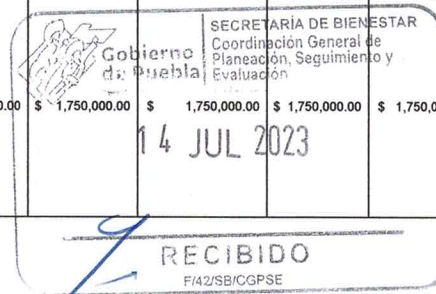




MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INFORME DEFINITIVO 2022



PUE220402202909	NA	22029	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE REAL DE LA COSTA SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO AJALPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SAN PEDRO AJALPAN	\$ 718,758.46	\$ 707,917.35	\$ 707,917.35	\$ 707,917.35	\$ 707,917.35	\$ 707,917.35	\$ 707,917.35	100.00%	100.00%	M2	511.80	OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE. (LA OBRA SE LLEVO A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS: FONDO FORTAMUN CAPITAL: \$ 705,591.97 INTERESES: \$ 2,325.38 TOTAL: \$ 707,917.35 FONDO FISM INTERESES \$ 9,500.00 EL MONTO TOTAL DE LA OBRA CONTRATADA ES DE \$ 717,417.35)
-----------------	----	-------	--	-------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------	---------	----	--------	--


 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 14 JUL 2023
 RECIBIDO
 F/42/SB/ICGPSE



MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES

INFORME DEFINITIVO 2022



FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS


Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Informe definitivo	0.00	0	21	4.35	1	23	EXISTE VARIACIÓN EN EL INDICADOR, POR REPROGRAMACIÓN DE OBRAS A SOLICITUD DE LOS BENEFICIARIOS.

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Informe definitivo	52.38	11	21	52.17	12	23	EXISTE VARIACIÓN EN EL INDICADOR, POR REPROGRAMACIÓN DE OBRAS A SOLICITUD DE LOS BENEFICIARIOS.

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Informe definitivo	47.62	10	21	43.48	10	23	





MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES



INFORME DEFINITIVO 2022

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Informe definitivo	100.00	4,566,263.00	4,566,263.00	100.00	4,566,263.00	4,566,263.00	RECURSO MINISTRADO
Indice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Informe definitivo	100.00	4,566,263.00	4,566,263.00	100.00	4,566,263.00	4,566,263.00	META ALCANZADA
Indice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Informe definitivo	100.00	4,566,263.00	4,566,263.00	100.00	4,566,263.00	4,566,263.00	META ALCANZADA
Indice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Informe definitivo	7.69	4,566,263.00	594,165.52	7.26	4,566,263.00	629,278.31	META ALCANZADA, EXISTIÓ MAYOR RECAUDACIÓN.
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	Informe definitivo	-3.19	14,967,228.96	15,460,893.27	2.12	16,304,070.24	15,965,611.9	EL MUNICIPIO RECIBIO MAYOR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES 2022.


Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones			
21	150	1	2022	2	33	I	4	FAIS MUNICIPAL INF DEF 2022		1	9506.00	6.00												MODULO TERMINADO AL 100%, LOS INTERESES SE EJERCIERON EN LA PARTIDA 614.		
		2											1	332	0.00	412000.00	412000.00	412000.00	412000.00	412000.00	412000.00				ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 2022 PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	
		2											1	441	1158000.00	1363928.18	1363928.18	1363928.18	1363928.18	1363928.18	1363928.18				CONSTRUCCIÓN DE 80 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES Y CUARTOS DORMITORIO, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2022.	
		2											2	612	1540460.06	542275.84	542275.84	542275.84	542275.84	542275.84	542275.84				CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN.	
		2											2	613	0.00	3498748.99	3498748.99	3498748.99	3498748.99	3498748.99	3498748.99				OBRAS DE AGUA POTABLE, ELECTRIFICACIÓN Y DRENAJE.	
		2											2	614	11030591.61	9347264.28	9347264.28	9347264.28	9347264.28	9347264.28	9347264.28				OBRAS DE PAVIMENTACIONES EN DIFERENTES LOCALIDADES, EN ESTA PARTIDA SE EJERCIERON LOS INTERESES EN LA OBRA 22029.	
		2											2	615	1575041.73	1702936.82	1702936.82	1702936.82	1702936.82	1702936.82	1702936.82				REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO A LAS INSPECTORIAS Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA) Y CAMINO SACACOSECHAS.	
		2											2	616	3073731.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				PARTIDA CANCELADA.
		2											2	622	0.00	1001125.63	1001125.63	1001125.63	1001125.63	1001125.63	1001125.63				REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO.	
		2											2	632	0.00	519045.26	519045.26	519045.26	519045.26	519045.26	519045.26				REHABILITACIÓN DE CANAL DE RIEGO PARA USO AGRÍCOLA.	
21	150	1	2022	2	33	I	5	FORTAMUN INF DEF 2022		1	2667.38	342.00													MODULO TERMINADO AL 100%, LOS INTERESES SE EJERCIERON EN LA PARTIDA 614.	
		2											1	311	1207308.30	1221152.00	1221152.00	1221152.00	1221152.00	1221152.00	1221152.00				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO 2022 PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	
		2											2	612	444188.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					PARTIDA CANCELADA.
		2											2	614	116112.88	3347436.38	3347436.38	3347436.38	3347436.38	3347436.38	3347436.38					OBRAS DE PAVIMENTOS Y LUMINARIAS, EN ESTA PARTIDA SE EJERCIERON LOS INTERESES EN LA OBRA 22029.
		2											2	616	2500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					PARTIDA CANCELADA.
		2											2	624	298653.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					PARTIDA CANCELADA.



DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO						OBSERVACIONES_CAPTURESTA		
CICLO	TRIM	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	
2022	5	PUE220402186407	1001125.63	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001125.63, modificado:1001125.63}}	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PARA LA ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA EN SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. TERCERA ETAPA. - 356528	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Huehuetlán el Grande	356528	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.33, meta_modificada:215.33}}	04-08-2022	17-09-2022	1001125.63	1001125.63	1001125.63	1001125.63	1001125.63	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.33}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE., trimestre:5.0, usuario:alvarorodriguez, fecha:2023-06-28}}	
2022	5	PUE220402202909	717417.35	{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FISM 2022 RENDIMIENTOS, monto:9500.0, modificado:9500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707917.35, modificado:707917.35}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE REAL DE LA COSTA SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO AJALPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetlán el Grande	22029	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.8, meta_modificada:511.8}}	11-11-2022	23-12-2022	717417.35	717417.35	717417.35	717417.35	717417.35	717417.35	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:511.8}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE. SE LLEVO A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS: FORTAMUN CAPITAL \$705,591.97 INTERESES \$2,325.38 TOTAL DEL FONDO DE FORTAMUN= \$707,917.35 FONDO FISM INTERESES \$9,500.00 MONTO TOTAL DE LA OBRA CONTRATADA \$717,417.35, trimestre:5.0,
2022	5	PUE220202099167	116112.88	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116112.88, modificado:116112.88}}	REHABILITACIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y ALCANTARILLA EN EL CALLEJÓN TONALCO ENTRE CALLE AVENTURA Y CALLE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE	22005	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.81, meta_modificada:245.81}}	04-03-2022	02-04-2022	116112.88	116112.88	116112.88	116112.88	116112.88	116112.88	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.81}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE., trimestre:5.0, usuario:alvarorodriguez, fecha:2023-06-28}}
2022	5	PUE220402185387	162417.7	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162417.7, modificado:162417.7}}	MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS BARRIOS DE IXTLAHUACAN, CENTRO Y COATEPEC, PERTENECIENTES A LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 352943	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetlán el Grande	352943	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.6, meta_modificada:264.6}}	06-05-2022	25-05-2022	162417.7	162417.7	162417.7	162417.7	162417.7	162417.7	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.6}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE., trimestre:5.0, usuario:alvarorodriguez, fecha:2023-06-28}}
2022	5	PUE220402188583	996861.09	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996861.09, modificado:996861.09}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA OTZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 363136	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetlán el Grande	363136	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2854.5, meta_modificada:2854.5}}	24-10-2022	22-11-2022	996861.09	996861.09	996861.09	996861.09	996861.09	996861.09	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3200.79}}	Validado avances	100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE., trimestre:5.0, usuario:alvarorodriguez, fecha:2023-06-28, obs2: {observación:OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE., trimestre:5.0, usuario:alvarorodriguez, fecha:2023-06-28}}
2022	5	PUE220402190052	1057382.91	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057382.91, modificado:1057382.91}}	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ZAPATA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS HUAJUAPAN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 367374	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetlán el Grande	367374	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:841.2, meta_modificada:841.2}}	07-07-2022	21-12-2022	1057382.91	1057382.91	1057382.91	1057382.91	1057382.91	1057382.91	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:841.2}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE., trimestre:5.0, usuario:alvarorodriguez, fecha:2023-06-28}}
2022	5	PUE220302128636	998125.33	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998125.33, modificado:998125.33}}	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN DE LA TRIPA ENTRE CALLEJÓN DEL ZORRILLO Y CALLE AVIACIÓN DEL BARRIO DE SAN ANTONIO COATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 203110	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetlán el Grande	203110	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:850.07, meta_modificada:874.4}}	14-07-2022	11-09-2022	998125.33	998125.33	998125.33	998125.33	998125.33	998125.33	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:874.4}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE., trimestre:5.0, usuario:alvarorodriguez, fecha:2023-06-28}}



DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO								OBSERVACIONES_CAPTURESTA
CICLO	TRIM	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	
2022	5	PUE220402203756	5746993.93	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, prog_estata_mun:GOBIERNO DEL ESTADO, monto:3996993.93, modificado:3996993.93}}	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CALLEJÓN DE LA GALLERA, PARTIENDO DE LA CARRETERA E.C. KM. 5 (LOS ÁNGELES ¿ LA CANTERA) ¿ SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, CON UNA LONGITUD DE 1,643.50, EN LAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN E IXTLAHUACÁN, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, EN EL ESTADO DE PUEBLA. (PRIMERA ETAPA).	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetlán el Grande	22026	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:821.75, meta_modificada:821.75}}	19-10-2022	31-03-2023	5746993.93	5746993.93	5746993.93	5746993.93	5746993.93	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:821.75}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE PRIMERA ETAPA, EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO., trimestre:5.0, usuario:alvarorodriguez, fecha:2023-06-28}}	
2022	5	PUE220302128575	542275.84	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542275.84, modificado:542275.84}}	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ATLAPULCO, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 202820	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huehuetlán el Grande	202820	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:128.25, meta_modificada:128.25}}	04-05-2022	02-07-2022	542275.84	542275.84	542275.84	542275.84	542275.84	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:128.25}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE., trimestre:5.0, usuario:alvarorodriguez, fecha:2023-06-28}}	
2022	5	PUE220402188187	519045.26	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519045.26, modificado:519045.26}}	REHABILITACIÓN DE CANAL DE RIEGO PARA USO AGRÍCOLA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 362007	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Huehuetlán el Grande	362007	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.05, meta_modificada:140.73}}	22-09-2022	21-10-2022	519045.26	519045.26	519045.26	519045.26	519045.26	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.73}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE., trimestre:5.0, usuario:alvarorodriguez, fecha:2023-06-28}}	
2022	5	PUE220202083928	998770.87	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998770.87, modificado:998770.87}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A SAN NICOLÁS ENTRE BARRANQUILLA Y CALLE 21 DE MARZO, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN AHUEHUETLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 100854	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetlán el Grande	100854	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:661.0, meta_modificada:701.22}}	08-03-2022	06-05-2022	998770.87	998770.87	998770.87	998770.87	998770.87	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:701.22}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE., trimestre:5.0, usuario:alvarorodriguez, fecha:2023-06-28}}	
2022	5	PUE220402188886	386031.63	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386031.63, modificado:386031.63}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE LAS FLORES Y CALLE LA ESTACIÓN, DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 363962	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetlán el Grande	363962	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:389.74, meta_modificada:389.74}}	12-10-2022	10-11-2022	386031.63	386031.63	386031.63	386031.63	386031.63	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:389.74}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE., trimestre:5.0, usuario:alvarorodriguez, fecha:2023-06-28}}	
2022	5	PUE220302128623	1036171.74	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036171.74, modificado:1036171.74}}	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE PUENTE EXISTENTE Y CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COATTELCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 203006	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetlán el Grande	203006	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:818.59, meta_modificada:929.77}}	13-06-2022	01-08-2022	1036171.74	1036171.74	1036171.74	1036171.74	1036171.74	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:929.77}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE., trimestre:5.0, usuario:alvarorodriguez, fecha:2023-06-28}}	
2022	5	PUE220402188740	861897.16	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861897.16, modificado:861897.16}}	CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COLONIA AGRÍCOLA HIDALGO, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 363563	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetlán el Grande	363563	{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	24-10-2022	22-12-2022	861897.16	861897.16	861897.16	861897.16	861897.16	{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE., trimestre:5.0, usuario:alvarorodriguez, fecha:2023-06-28}}	

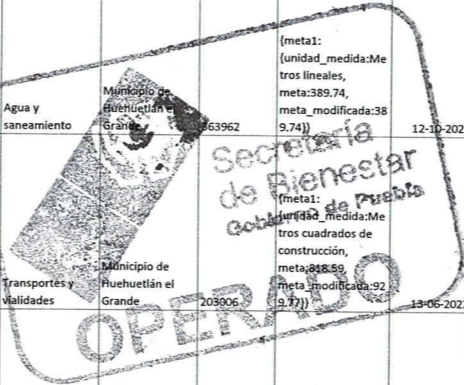

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO								OBSERVACIONES_CAPTURESTA
CICLO	TRIM	FOLO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	
2022	5	PUE220402192226	788260.52	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788260.52, modificado:788260.52}}	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 374301	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Huehuetlán el Grande	374301	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1658.0, meta_modificada:3517.8}}	07-11-2022	21-12-2022	788260.52	788260.52	788260.52	788260.52	788260.52	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3517.8}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE., trimestre:5.0, usuario:alvarorodriguez, fecha:2023-06-28}}	
2022	5	PUE220302127957	914676.3	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914676.3, modificado:914676.3}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO A LAS INSPECTORÍAS Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA. - 200103	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetlán el Grande	200103	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4200.0, meta_modificada:3024.0}}	26-02-2022	26-04-2022	914676.3	914676.3	914676.3	914676.3	914676.3	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3024.0}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M3., trimestre:5.0, usuario:alvarorodriguez, fecha:2023-07-05}}	
2022	5	PUE220402192031	1153738.93	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153738.93, modificado:1153738.93}}	CONSTRUCCIÓN DE 80 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN AHUEHUETLA, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA. - 373619	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huehuetlán el Grande	373619	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}}	02-05-2022	11-05-2022	1153738.93	1153738.93	1153738.93	1153738.93	1153738.93	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:80.0}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE., trimestre:5.0, usuario:alvarorodriguez, fecha:2023-06-28}}	
2022	5	PUE220402188038	552268.34	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552268.34, modificado:552268.34}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN DE LA GALLERA, ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 361580	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetlán el Grande	361580	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:692.6, meta_modificada:692.6}}	08-08-2022	06-09-2022	552268.34	552268.34	552268.34	552268.34	552268.34	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:692.6}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE., trimestre:5.0, usuario:alvarorodriguez, fecha:2023-06-28}}	
2022	5	PUE220202084144	1528941.35	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1528941.35, modificado:1528941.35}}	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL DESTINO ENTRE CALLE TOXPAN Y CALLE TECORIZO, DEL BARRIO DE ANALCO PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 101735	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetlán el Grande	101735	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1280.0, meta_modificada:1279.92}}	05-04-2022	24-05-2022	1528941.35	1528941.35	1528941.35	1528941.35	1528941.35	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1279.92}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE., trimestre:5.0, usuario:alvarorodriguez, fecha:2023-06-28}}	
2022	5	PUE220202084177	997195.67	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997195.67, modificado:997195.67}}	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DEL LADRILLO ENTRE CALLEJÓN DE LA GALLERA Y CALLE DEL PROGRESO, DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 101823	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetlán el Grande	101823	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:944.0, meta_modificada:945.04}}	05-04-2022	02-07-2022	997195.67	997195.67	997195.67	997195.67	997195.67	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:945.04}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE., trimestre:5.0, usuario:alvarorodriguez, fecha:2023-06-28}}	
2022	5	PUE220202084192	356068.43	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356068.43, modificado:356068.43}}	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DEL CALLEJÓN CORREGIDORA, ENTRE CALLE EL VALOR Y CALLE DEL PROGRESO DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 101872	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetlán el Grande	101872	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:359.0, meta_modificada:467.82}}	29-04-2022	12-06-2022	356068.43	356068.43	356068.43	356068.43	356068.43	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:467.82}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE., trimestre:5.0, usuario:alvarorodriguez, fecha:2023-06-28}}	



DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIM	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA		
2022	5	PUE220302128647	1440441.55	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440441.55, modificado:1440441.55}}	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CARRETERA A PUEBLA Y BACHILLERATO GENERAL OFICIAL HÉROES DEL 5 DE MAYO, DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ATLAPULCO, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 203144	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetlán el Grande	203144	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1151.4, meta_modificada:1319.33)}	27-07-2022	24-09-2022	1440441.55	1440441.55	1440441.55	1440441.55	1440441.55	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1319.33)}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE., trimestre:5.0, usuario:alvarorodriguez, fecha:2023-06-28}}		
2022	5	PUE220302140260	423136.78	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423136.78, modificado:423136.78}}	MANTENIMIENTO DE CALLES Y ACCESOS PRINCIPALES POR RETIRO DE DERRUMBES EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetlán el Grande	22019	{meta1: (unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3507.5, meta_modificada:3507.5)}	12-07-2022	10-08-2022	423136.78	423136.78	423136.78	423136.78	423136.78	{meta1: (unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3507.5)}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE., trimestre:5.0, usuario:alvarorodriguez, fecha:2023-06-28}}		
2022	5	PUE220402186238	539273.07	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539273.07, modificado:539273.07}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 356082	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetlán el Grande	356082	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:964.71, meta_modificada:964.71)}	07-06-2022	05-08-2022	539273.07	539273.07	539273.07	539273.07	539273.07	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:964.71)}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE., trimestre:5.0, usuario:alvarorodriguez, fecha:2023-06-28}}		
2022	5	PUE220202099177	350269.37	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350269.37, modificado:350269.37}}	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LÁMPARAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	Huehuetlán el Grande	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	22012	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:130.0, meta_modificada:350.0)}	04-05-2022	04-06-2022	350269.37	350269.37	350269.37	350269.37	350269.37	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:350.0)}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE., trimestre:5.0, usuario:alvarorodriguez, fecha:2023-06-28}}		
2022	5	PUE220302128603	924666.43	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924666.43, modificado:924666.43}}	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA YANCUITLALPAN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 202930	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetlán el Grande	202930	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:970.89, meta_modificada:1083.09)}	09-06-2022	07-08-2022	924666.43	924666.43	924666.43	924666.43	924666.43	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1083.09)}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE., trimestre:5.0, usuario:alvarorodriguez, fecha:2023-06-28}}		
2022	5	PUE220302129655	210189.25	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210189.25, modificado:210189.25}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ATLAPULCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 207218	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huehuetlán el Grande	207218	{meta1: (unidad_medida:Cuartos, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}	06-07-2022	04-08-2022	210189.25	210189.25	210189.25	210189.25	210189.25	{meta1: (unidad_medida:Cuartos, avance:2.0)}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE., trimestre:5.0, usuario:alvarorodriguez, fecha:2023-06-28}}		
2022	5	PUE220302130181	412000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412000.0, modificado:412000.0}}	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 209699	Huehuetlán el Grande	Otros Proyectos		Municipio de Huehuetlán el Grande	209699	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	05-05-2022	03-07-2022	412000	412000	412000	412000	412000	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)}	Validado avances	{obs1: {observación:SERVICIO AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE., trimestre:5.0, usuario:alvarorodriguez, fecha:2023-06-28}}		




TIPO_REGISTRO	CICLO	TRIM	ENTIDAD_FEDERATIVA	MUNICIPIO	CICLO_RECURSO	ID_RAMO	RAMO	ID_PP	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	TIPO_RECURSO	PROG_FND_CONV_ESP	INSTITUCION_EJECUTORA	RENDIMIENTO	REINTEGRO	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA_GENERICA	DESC_PARTIDA_GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES (CAPTURA)	ESTATUS	
1-Programa presupuestario	2022	5	Puebla	Huehuetlán Grande	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS MUNICIPAL INF DEF 2022	Municipio de Huehuetlán Grande	el 9506	6												MODULO TERMINADO AL 100% , LOS INTERESES SE EJERCIERON EN LA PARTIDA 614	Validado
2-Partida genérica	2022	5	Puebla	Huehuetlán Grande	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS MUNICIPAL INF DEF 2022	Municipio de Huehuetlán Grande			Gasto de Inversión	622	Edificación no habitacional	0.00	1001125.63	1001125.63	1001125.63	1001125.63	1001125.63	1001125.63	1001125.63	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	Validado
2-Partida genérica	2022	5	Puebla	Huehuetlán Grande	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS MUNICIPAL INF DEF 2022	Municipio de Huehuetlán Grande			Gasto corriente	441	Ayudas sociales a personas	1158000.00	1363928.18	1363928.18	1363928.18	1363928.18	1363928.18	1363928.18	CONSTRUCCIÓN DE 80 SISTEMAS DE SANAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES Y CUARTOS DORMITORIO, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2022.	Validado	
2-Partida genérica	2022	5	Puebla	Huehuetlán Grande	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS MUNICIPAL INF DEF 2022	Municipio de Huehuetlán Grande			Gasto de Inversión	616	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	3073731.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PARTIDA CANCELADA	Validado	
2-Partida genérica	2022	5	Puebla	Huehuetlán Grande	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS MUNICIPAL INF DEF 2022	Municipio de Huehuetlán Grande			Gasto corriente	332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	412000.00	412000.00	412000.00	412000.00	412000.00	412000.00	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 2022 PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	Validado	
2-Partida genérica	2022	5	Puebla	Huehuetlán Grande	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS MUNICIPAL INF DEF 2022	Municipio de Huehuetlán Grande			Gasto de Inversión	614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	11030591.61	9347264.28	9347264.28	9347264.28	9347264.28	9347264.28	9347264.28	OBRAS DE PAVIMENTACIONES EN DIFERENTES LOCALIDADES, EN ESTA PARTIDA SE EJERCIERON LOS INTERESES EN LA OBRA 029.	Validado	
2-Partida genérica	2022	5	Puebla	Huehuetlán Grande	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS MUNICIPAL INF DEF 2022	Municipio de Huehuetlán Grande			Gasto de Inversión	613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	3498748.99	3498748.99	3498748.99	3498748.99	3498748.99	3498748.99	OBRAS DE AGUA POTABLE, ELECTRIFICACIÓN Y DRENAJE	Validado	
2-Partida genérica	2022	5	Puebla	Huehuetlán Grande	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS MUNICIPAL INF DEF 2022	Municipio de Huehuetlán Grande			Gasto de Inversión	612	Edificación no habitacional	1540460.06	542275.84	542275.84	542275.84	542275.84	542275.84	542275.84	542275.84	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	Validado
2-Partida genérica	2022	5	Puebla	Huehuetlán Grande	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS MUNICIPAL INF DEF 2022	Municipio de Huehuetlán Grande			Gasto de Inversión	632	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	0.00	519045.26	519045.26	519045.26	519045.26	519045.26	519045.26	519045.26	REHABILITACIÓN DE CANAL DE RIEGO PARA USO AGRÍCOLA	Validado
2-Partida genérica	2022	5	Puebla	Huehuetlán el Grande	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS MUNICIPAL INF DEF 2022	Municipio de Huehuetlán Grande			Gasto de Inversión	615	Construcción de vías de comunicación	1575041.73	1702936.82	1702936.82	1702936.82	1702936.82	1702936.82	1702936.82	1702936.82	REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO A LAS INSPECTORIAS Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA) Y CAMINO SACACOSECHAS.	Validado
1-Programa presupuestario	2022	5	Puebla	Huehuetlán Grande	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN INF DEF 2022	Municipio de Huehuetlán Grande	el 266728	342												MODULO TERMINADO AL 100% , LOS INTERESES SE EJERCIERON EN LA PARTIDA 614	Validado
2-Partida genérica	2022	5	Puebla	Huehuetlán Grande	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN INF DEF 2022	Municipio de Huehuetlán Grande			Gasto de Inversión	616	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	2500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PARTIDA CANCELADA	Validado



TIPO_REGISTRO	CICLO	TRIM	ENTIDAD_FEDERATIVA	MUNICIPIO	CICLO_RECURSO	ID_RAMO	RAMO	ID_PP	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	TIPO_RECURSO	PROG_FND_CONV_ESP	INSTITUCION_EJECUTORA	RENDIMIENTO	REINTEGRO	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA_GENERICA	DESC_PARTIDA_GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES (CAPTURA)	ESTATUS	
2-Partida genérica	2022	5	Puebla	Huehuetlán Grande	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN INF DEF 2022	Municipio de Huehuetlán Grande			Gasto corriente	311	Energía eléctrica	1207308.30	1221152.00	1221152.00	1221152.00	1221152.00	1221152.00	1221152.00	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO 2022 PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	Validado	
2-Partida genérica	2022	5	Puebla	Huehuetlán Grande	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN INF DEF 2022	Municipio de Huehuetlán Grande			Gasto de Inversión	612	Edificación no habitacional	444188.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PARTIDA CANCELADA	Validado
2-Partida genérica	2022	5	Puebla	Huehuetlán Grande	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN INF DEF 2022	Municipio de Huehuetlán Grande			Gasto de Inversión	624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	298653.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PARTIDA CANCELADA	Validado
2-Partida genérica	2022	5	Puebla	Huehuetlán Grande	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN INF DEF 2022	Municipio de Huehuetlán Grande			Gasto de Inversión	614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	116112.88	3347436.38	3347436.38	3347436.38	3347436.38	3347436.38	3347436.38	OBRAS DE PAVIMENTOS Y LUMINARIAS, EN ESTA PARTIDA SE EJERCIERON LOS INTERESES EN LA OBRA 029.	Validado	



Ciclo	Trim	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2022	5	Huehuetlán el Grande	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	169354	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	47.61905		39.13043	{just1:{ciclo:2022,trim:5,just:Otras causas,usuario:alvaro rodriguez,fecha:03/07/23}}		43.47826	Otras causas	META ALCANZADA.	90	Validado
2022	5	Huehuetlán el Grande	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	169772	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	52.38095		56.52174	{just1:{ciclo:2022,trim:5,just:Otras causas,usuario:alvaro rodriguez,fecha:03/07/23}}		52.17391	Otras causas	EXISTE VARIACIÓN EN EL INDICADOR, POR REPROGRAMACIÓN DE OBRAS A SOLICITUD DE LOS BENEFICIARIOS.	92.31	Validado
2022	5	Huehuetlán el Grande	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	170586	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0		4.34783	{just1:{ciclo:2022,trim:5,just:Otras causas,usuario:alvaro rodriguez,fecha:03/07/23}}		4.34783	Otras causas	EXISTE VARIACIÓN EN EL INDICADOR, POR REPROGRAMACIÓN DE OBRAS A SOLICITUD DE LOS BENEFICIARIOS.	100	Validado
2022	5	Huehuetlán el Grande	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	173169	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	{(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1}*100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	-3.19299		-3.19299			2.11993	Otras causas	EL MUNICIPIO RECIBIO MAYOR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES 2022.	-66.39	Validado
2022	5	Huehuetlán el Grande	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	174145	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100		100			100		META ALCANZADA	100	Validado
2022	5	Huehuetlán el Grande	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	174452	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Ascendente	7.68518		7.68518			7.25635	Otras causas	META ALCANZADA, EXISTIÓ MAYOR RECAUDACIÓN.	105.91	Validado
2022	5	Huehuetlán el Grande	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	174458	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	{(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN)} * 100	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100		100			100		META ALCANZADA	100	Validado



Ciclo	Trim	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo	
2022	5	Huehuetlán el Grande	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	174459	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100		100			100			RECURSO MINISTRADO	100	Validado

